

令和元年度 夏期合同パトロール日程表

令和元年 7月4日(木)

日 程

- 8:00~8:15 出欠確認
(チームリーダー)
- 8:20~8:25 喜友会会長挨拶
(遠藤会長)
- 8:25~8:30 内容説明
- 8:30 パトロール出発

ホテルウェルネス(Tel0182-33-0600)
《8時00分 集合》

45人乗りバス

1号車(A班)
(8:30出発)

27人乗りバス

2号車(B班)
(8:30出発)

移動時間 30分

(到着時間 9:00頃)

移動時間 20分

(到着時間 8:50頃)

河川災害復旧助成工事
30-KJ10-30

巡視時間 30分 (出発 9:30)

横手市大森町上溝 地内
現場代理人 藤倉 一彦

こひつじ施設整備事業
園舎改築工事

巡視時間 30分 (出発 9:20)

横手市十文字町字栄町 地内
現場代理人 金 長利

移動時間 30分

(到着時間 10:00頃)

移動時間 30分

(到着時間 9:50頃)

株式会社 岡部興業
低温倉庫新築工事
巡視時間 30分 (出発 10:30)

横手市杉沢字南杉沢 地内
現場代理人 石橋 亘

下院内地区橋梁下部工工事
巡視時間 30分(出発 10:20)

湯沢市下院内 地内
現場代理人 大日向 康

移動時間 20分

(到着時間 10:50頃)

移動時間 30分

(到着時間 10:50頃)

ホテルウェルネス
各現場の講評と検討会

- 10:50~11:20 各班の検討事項まとめ
- 11:20~11:25 社長挨拶(中村社長)
- 11:25~11:55 現場報告・検討会
- 11:55~12:00 事業主講評(村田専務)
- 12:00 閉会 ~ 昼食

昼食の後 散会

令和元年度 夏期安全衛生活動実施状況

実施年月日 令和元年 7月4日(木)

夏期合同パトロール AM8:15～12:00

喜友会会員	62	名
社員	13	名
合計	75	名

巡回現場 4 現場

開会式



遠藤会長 挨拶



河川災害復旧助成工事 30-KJ10-30



㈱岡部興業低温倉庫新築工事



こひつじ施設整備事業園舎改築工事



下院内地区橋梁下部工工事



検討会実施状況



中村社長 挨拶



A班現場講評
チームリーダー菅原 衛



災害復旧助成工事30-KJ10-30
藤倉一彦 現場代理人答弁



㈱岡部興業低温倉庫新築工事
石橋亘 現場代理人答弁



こひつじ施設園舎改築工事
金長利 現場代理人答弁



下院内地区橋梁下部工工事
大日向康 現場代理人答弁



事業主講評 村田専務



実施年月日 令和元年 7月5日(金)

交通安全講話 PM1:30～2:30



夏期合同安全衛生パトロール報告書

工事名 河川災害復旧助成工事
30-KJ10-30

工事安全衛生方針：吊荷の落下事故を未然に防ぐため使用用具の点検確認
合図方法の確認を徹底する。

工事安全衛生目標： 1、法令違反の絶無
2、重機災害・交通災害の絶無
3、危険個所の早期発見・早期是正の徹底

実施者 チームリーダー
菅原 衛

現場代理人 藤倉 一彦 主任技術者 伊藤 聡 担当技術者 荒川 道義 三浦 隼斗

パトロール巡視状況



実施年月日 令和 1 年 7 月 4 日

本日の作業内容

- ・ コンクリートブロック積 4名、表土剥ぎ取り 1名、取付擁壁型枠組 5名
取付擁壁足場組立 4名、大型土のう製作 4名、安全施設 2名、荷振り 1名
計 21名

パトロールの指摘または要望事項

- 1、産廃かご（可燃物用）下段のメッシュがめくれあがって危険である。
- 2、水中ポンプキャプタイヤのアース線が接続されていない。
(安衛則333条 漏電による感電防止)
- 3、資材置場を囲っている鉄筋に、キャップ等でカバーをしたほうがより良い。
- 4、工事用道路が分岐している箇所に、行き先を明示したほうが良い。
- 5、安全書類において、確認印漏れや周知のサインが抜けているものがあった。

良かった点

- 1、工事用車両が全車出船駐車をして、輪留めもしっかりされていた。
- 2、安全看板が、適材適所に表示されていた。
- 3、敷鉄板に滑り止め用に鉄筋が溶接されていた。
- 4、現場手すりに浮き輪が常備されていて、万に備えていた。
- 5、場内整理整頓が良くされていた。
- 6、安全書類はよく管理され見やすく整理されていて良い。

クレーン合図の統一

良好な点



指摘事項

メッシュがめくれあがって危険



場内整理整頓



敷鉄板のすべり止め



救助用浮き輪



夏期合同安全衛生パトロール報告書

工事名 (株)岡部興業低温倉庫新築工事

工事安全衛生方針：土工事、本体工事における重機災害、墜落災害防止対策を徹底し『災害ゼロ』を目指す。
工事安全衛生目標：1、重機災害、死角への立入禁止と作業半径能力の周知による安全確保
2、作業場出入り及び近接道路の通行指導による第三者災害の防止

実施者 チームリーダー
菅原 衛

現場代理人 石橋 亘 担当技術者 藤原 渉

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

パトロール巡視状況



本日の作業内容

- 基礎（ベース）立上り型枠組立・基礎排水スリーブ取付 5名
計 5名

パトロールの指摘または要望事項

- 昇降タラップの固定が緩んでいた。
(安衛則527条 移動はしごの転倒防止)
- 発電機の端子に余分なコードがあり金属が露出していて危険である。
- 休憩用のテントに飛散防止の控えがとられていなかった。
- 燃料タンクが、灰皿と一緒にになっている。

良かった点


- 安全打合せ簿において、安全指示事項が細かく記入されていて良い。
- 作業打合せ時において、所長が再チェックして、赤ペンなどで適時訂正しながら実施されている。（内容の濃い打ち合わせとなっていて大変良い。）

施工状況



指摘事項

余分な線がついている

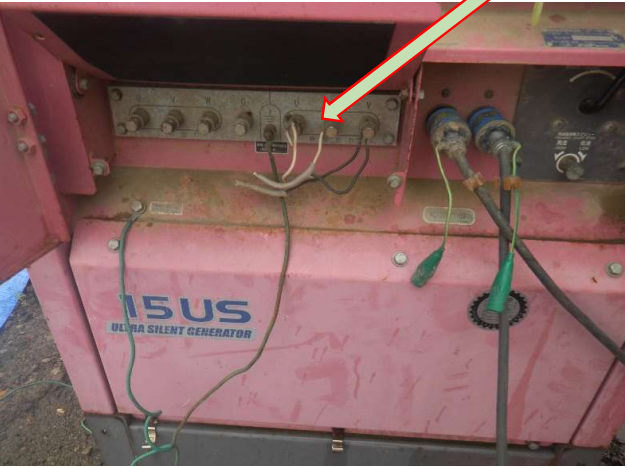

固縛が緩んでいる



燃料タンクと灰皿と一緒に保管



良好な点

作業個所の区分け



夏期合同安全衛生パトロール報告書

工事名 学校法人こひつじ学園
認定こども園こひつじ施設整備事業
園舎改築工事

工事安全衛生方針:『報・連・相』をモットーとし実施することで、災害のない職場環境づくりを目指す
工事安全衛生目標:『第三者交通災害ゼロ・飛来落下
及び墜落災害ゼロ』を目指し
より良い職場環境の形成を図る



ナイス! 方針

実施者

チームリーダー
福田 暁

現場代理人 金 長利 担当技術者 宮崎 元基

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

パトロール巡視状況



本日の作業内容
・ 大作業 11名、荷振り作業 1名、配管工事 1名 合計 13名
パトロールの指摘または要望事項
1、ドラムのキャプタイヤが、通路上に配線されており、漏電やつまづきの原因になる。 2、コンプレッサーに持ち込み許可証の表示がない。 3、吊荷の合図者が、クレーンオペから見えづらいのではないのでしょうか。 4、架線に近いので、注意すること。
良かった点
1、階段のステップに色付けして段差がわかりやすい。 2、花とトマトが植えられていて、環境美化になっている。 3、狭い施工ヤードではあるが、コンパクトに対応している。 4、安全書類はよく整理されている。内容について、指摘箇所は特に無し 5、熱中症対策も良く施されていた。

施工状況



指摘事項

良好な点




持込許可証の表示




地べた配線



ステップの色表示

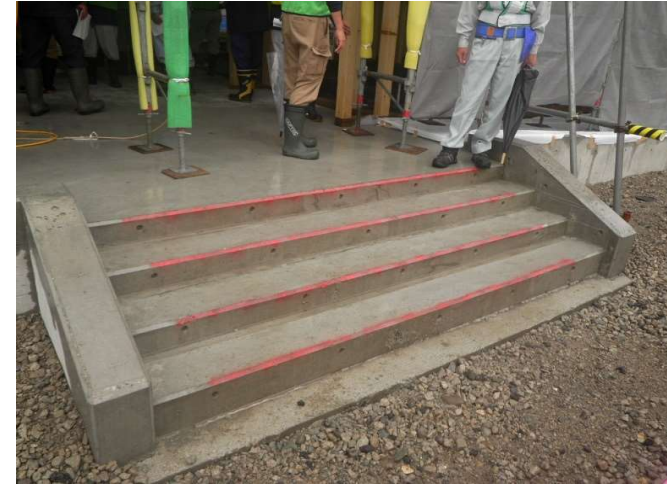

環境美化

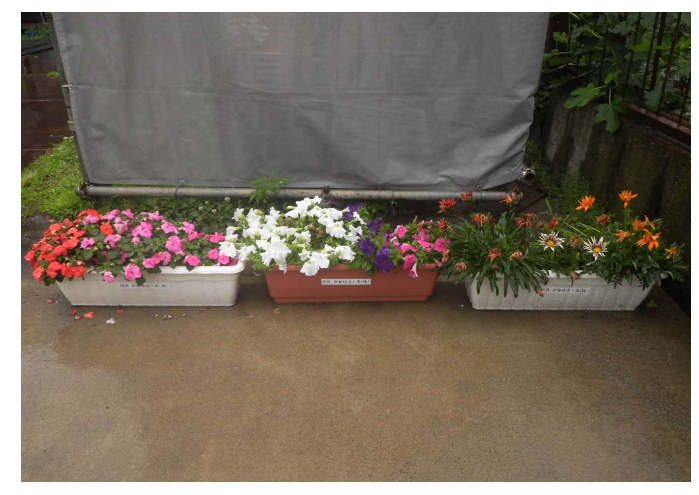

中央安全衛生パトロール報告書

工事名 下院内地区橋梁下部工工事

工事安全衛生方針：『建設産業発展に向けた、新3K（給料・休日・希望）も実現とICT技術を取り入れた働き方改革の実現』
工事安全衛生目標：『誰もが安心・安全 快適職場』

😊 ナイス！方針

実施者 チームリーダー
福田 暁

現場代理人 大日向 康 監理技術者 玉谷 孝徳 担当技術者 柿崎 志歩

実 施 年 月 日 令和 1 年 7 月 4 日

パトロール巡視状況



量水標設置状況



危険降雨量の想定基準



指摘事項

ごみの分別表示



良好な点



熱中症対策



車止めに設置



本日の作業内容
・アースオーガー建込 1名、鋼矢板建込 1名、鋼矢板圧入作業 4名 ヤード整備 2名 合計 8名
パトロール指摘事項
1、産廃がご替わりに使用しているトンパックに分別表示がない。 2、休憩所の吸い殻入れが、枯草の上に置いていて、火災の原因になる。 3、敷鉄板が、雨で滑りやすくなっていて危険である。
安全衛生指導事項
1、水位計が現場に設置されていて良い。 2、日陰に設置されている休憩所が、熱中症対策に大変良い。 3、車止めが、全車されていた。 4、安全書類が大変良く整理されており、印象が良かった。 5、快適職場への取組が、良くされている。 6、現場事務所内も、大変きれいに整理されていた。
