

令和元年度 年末合同パトロール日程表

令和元年12月5日(木)

ホテルウェルネス横手路

- ・ 出欠確認 (チームリーダー) 7:50~8:15
- ・ 喜友会遠藤会長挨拶 8:20~8:25
- ・ 趣旨説明 8:25~8:30
- ・ パトロール出発 8:30

45人乗りバス

1号車(A班)

移動時間
30分

到着9:00頃

パトロール現場
社会福祉法人横手愛燦会
たいゆう保育園建設工事
(所要時間 30分)
横手市大雄字田村地内
現場代理人 福田 暁

現場出発 9:30

到着9:50頃

パトロール現場
山城堰地区 ため池等整備
(河川対応)工事 01603-K01
(所要時間 30分)
横手市大森町本郷 地内
現場代理人 菅原 衛

現場出発 10:20

到着 10:50頃

ホテルウェルネス横手路
(検討会)
各現場巡視結果の発表

終了後、昼食及び散会

33人乗りバス

2号車(B班)

移動時間
20分

到着8:50頃

パトロール現場
十文字小学校建設工事
(所要時間 30分)
横手市十文字町十五野新田 地内
現場代理人 清水 誠

現場出発 9:20

到着9:50頃

パトロール現場
前林地区道路改良工事
(所要時間 30分)
湯沢市下院内 地内
現場代理人 大野翔平

現場出発 10:20

到着 10:50頃

- ・ 検討会 10:50~11:20
- ・ 中村社長挨拶 11:20~11:25
- ・ 発表会 11:25~11:55
- ・ 事業主講評 千葉常務 11:55~12:00
- ・ 閉会 12:00

令和元年度 年末安全衛生活動 実施状況

実施年月日 令和元年 12月5日(木)

年末合同パトロール
AM8:15~12:00

喜友会	58 名
社員	16 名
合計	74 名
巡回現場	4 現場


遠藤喜友会会長 挨拶



社会福祉法人よこて愛燦会
たいゆう保育園建設工事



山城堰地区ため池等整備
(河川対応)工事01603-K01

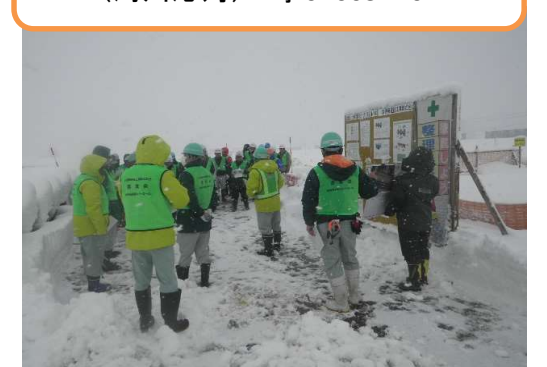

十文字小学校建設工事



前林地区道路改良工事



各班の検討会



中村社長 挨拶



A班 現場・書類講評



福田暁 現場代理人答弁



菅原 衛 現場代理人答弁



B班 現場・書類講評



清水 誠 現場代理人答弁



大野翔平 現場代理人答弁



事業主講評 千葉常務



交通安全講話 PM1:30~2:30



年末合同安全衛生パトロール報告書

工事名 社会福祉法人横手愛燦会
たいゆう保育園建設工事

工事安全衛生方針：「安全」「健康」の確保を最優先し、無事故無災害の達成を目標に
安全で快適な職場環境の形成を目指す。
工事安全衛生目標：保育園利用者等の第三者災害防止対策の徹底
及び、周囲への飛散防止を重視し、
安全計画の充実寄作業員への安全教育を徹底する。

現場代理人 福田 暁 担当技術者 金 長利 伊藤 彰馬

チームリーダー
実施者 渡部 保則

実施年月日 令和 1 年 12 月 5 日

パトロール状況



施工状況



本日の作業内容

- 鉄筋工事 7名、型枠工事 3名、屋根工事 7名、防水工事 5名
機械設備工事 13名、場内整備 11名 合計 46名

パトロール指摘事項

- 側溝上に渡した敷鉄板端部に、穴が開いていて危険である。
- 建物への出入りのための通路と、建物内の安全通路を確保すること。
(安衛則540条 安全通路)
- 壁差し筋上部に、刺さらないための養生が必要である。
- 資材置き場に表示があった方がよい。
- バックホウの排土板を、上げた状態で駐機していた。
(安衛則160条 運転席から離れる場合の措置)
- 新規入場者一覧表の実施者に、押印が無い日があった。
- 災防協の参加者のサインが抜けていた。

良かった点


- 現場休憩所並びにトイレがきれいで良かった。
- 駐車スペースが整然とされていて良い。
- 事務所階段下の踏み台にしているパレットに、滑り止めが必要と思われる。
- 全体的に書類が良く整理されている。

指摘事項

安全通路と差し筋の養生



敷鉄板端部の穴

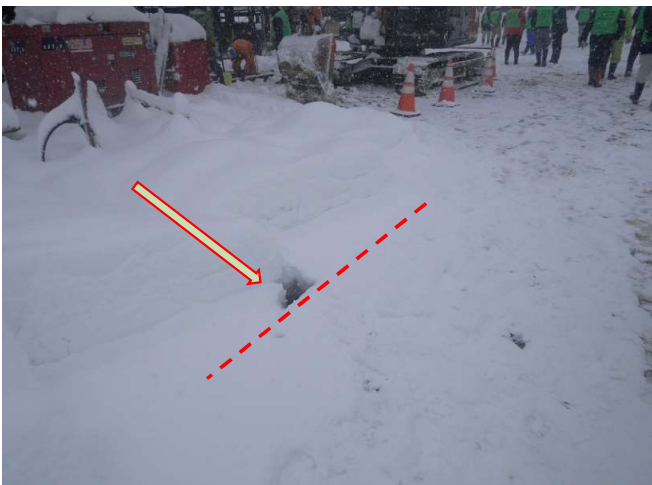

駐機状況



年末合同安全衛生パトロール報告書

工事名 山城堰地区 ため池等整備
(河川対応)工事 01603-K01

工事安全衛生方針:『災害ゼロ』を目標に、労働災害の重要性を再認識し、安全で快適な職場環境づくりを目指す。
工事安全衛生目標:重機災害・労働災害・交通災害、発生件数ゼロを達成する！

現場代理人 菅原 衛

😊 ナイス！方針

実施者 チームリーダー
渡部 保則

パトロール状況



パトロール状況



作業状況



実施年月日 令和 1 年 12 月 5 日

本日の作業内容
・ 護床工 平面ブロック2t型製作(生コン打設・型枠脱型・組立) 平面ブロック2t:生コン打設 16個 平面ブロック2t:脱型・組立 16個 合計 8名
パトロール指摘事項
1、防火対策として、ジェットヒーターの傍に消火器を設置すること。 2、電工ドラムの配線が、雪で埋もれていて切断の恐れがある。 3、通路の路肩が、判別しにくい。 4、型枠組立の作業員に、保護メガネと安全靴の着用を検討してください。 5、現場入口部の鉄板のすべり止め用鉄筋が、取れかかっているものはあった。 6、安全書類で、安全衛生責任者の自筆のサインが漏れていた。
良かった点
1、整理整頓がされて、とても良い。 2、現場のトイレがきれいであった。 3、場内の架空線の注意喚起の表示がされていた。 4、全体的に書類はよく整理されていた。 5、現場事務所内の整理整頓が行き届いていた。

指摘事項

消火器の設置

年末合同安全衛生パトロール報告書

工事安全衛生方針:『災害ゼロ』を目標に、労働災害防止の重要性を再確認し
安全かつ快適な職場環境づくりを目指す。
工事安全衛生目標:高所からの転落及び飛来落下災害の撲滅と
第三者災害ゼロを実現するため、全作業員の安全教育を徹底する。

チームリーダー
実施者 金田 基

工事名 十文字小学校建設工事(建築本体工事)

現場代理人 清水 誠 主任技術者 松井 努・五十嵐 裕之 担当技術

実施年月日 令和 1 年 12 月 5 日

パトロール状況



パトロール状況



良かった点

仮囲いの絵の掲示状況



掲示物



振動・風速・騒音計



週間工程表の掲示



指摘事項

建物屋根の雪庇



本日の作業内容

・ 管理棟 2工区 埋戻し、屋体棟 1工区 型枠解体 2工区 型枠組立
駐車場 路盤工 場内整備 合計 42名

パトロール指摘事項

- 1、防火水槽と安全掲示板に、雪がかかっている見にくい。
- 2、現場休憩所屋根の雪庇が、落雪の恐れがあるので危険である。

良かった点

- 1、掲示ポスター・スローガン等が、各所に掲示されていた。
- 2、現場の仮囲いに、小学生の絵が掲げられていた。
- 3、ゲート部に、振動・風速・騒音の表示があり、隣接する中学校への配慮が見受けられた。
- 4、トイレが屋根付きで、衛生面でも配慮されていた。
- 5、書類が良く整理されていた。
- 6、打ち合わせ会議に、電子黒板を利用し実施している。
- 7、安全日誌について、指示事項が赤字で記入され見やすい。

年末合同安全衛生パトロール報告書

工事名 前林地区道路改良工事

工事安全衛生方針：工事現場に潜む危険なリスクの『見える化』を徹底し、
従事者全員による無事故無災害現場を目指す。
工事安全衛生目標：『重機災害・墜落災害防止の徹底』



ナイス！方針

実施者 チームリーダー
金田 基

現場代理人 大野 翔平

監理技術者 丹 修平

担当技術者 佐々木 学

パトロール状況



パトロール状況



実施年月日 令和 1 年 12 月 5 日

本日の作業内容

・ コンクリート養生、側壁止め型枠、除雪 4名 合計 4名

パトロール指摘事項

- 1、敷鉄板上が、滑りやすくなっているので、こまめな対策を講じた方が良い。
- 2、養生内において、通路面のクランプの角や、飛び出している番線などがあるので対策を講じてください。
- 3、養生のブルーシートが、雪の重みでたるんでいて危険である。
- 4、現場内への雪崩の恐れがあるので、その対応を協議するべきではないか。
- 5、安全書類については、指摘事項はありません。

良かった点

- 1、作業車の輪留めがされていて良い。
- 2、作業計画書や作業手順書について、良くまとめられている。また、すべてにチェックマークが付けられ良く管理されている。
- 3、健康診断実施計画書にて、高血圧の作業員には診断書で確認している。


指摘事項

良かった点

輪留めの設置



敷鉄板上のすべり止め

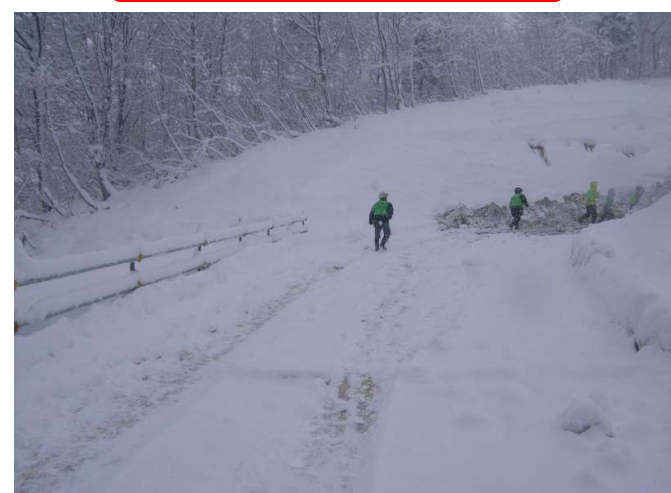

ブルーシート上の排雪



クランプ等の養生措置

